PROYECTO ANTUCOYA - SECUENCIA DE METODOLOGIA DE PRECOMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO

TERMINO DE CONSTRUCCION — SISTEMAS FACILITY (OOCC/Arqui.) BOP

PRECOMISIONAMIENTO — SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES (Operación y Mantención) BOP

COMISIONAMIENTO — SISTEMAS DE PROCESO (Operaciones Unitarias) BOP

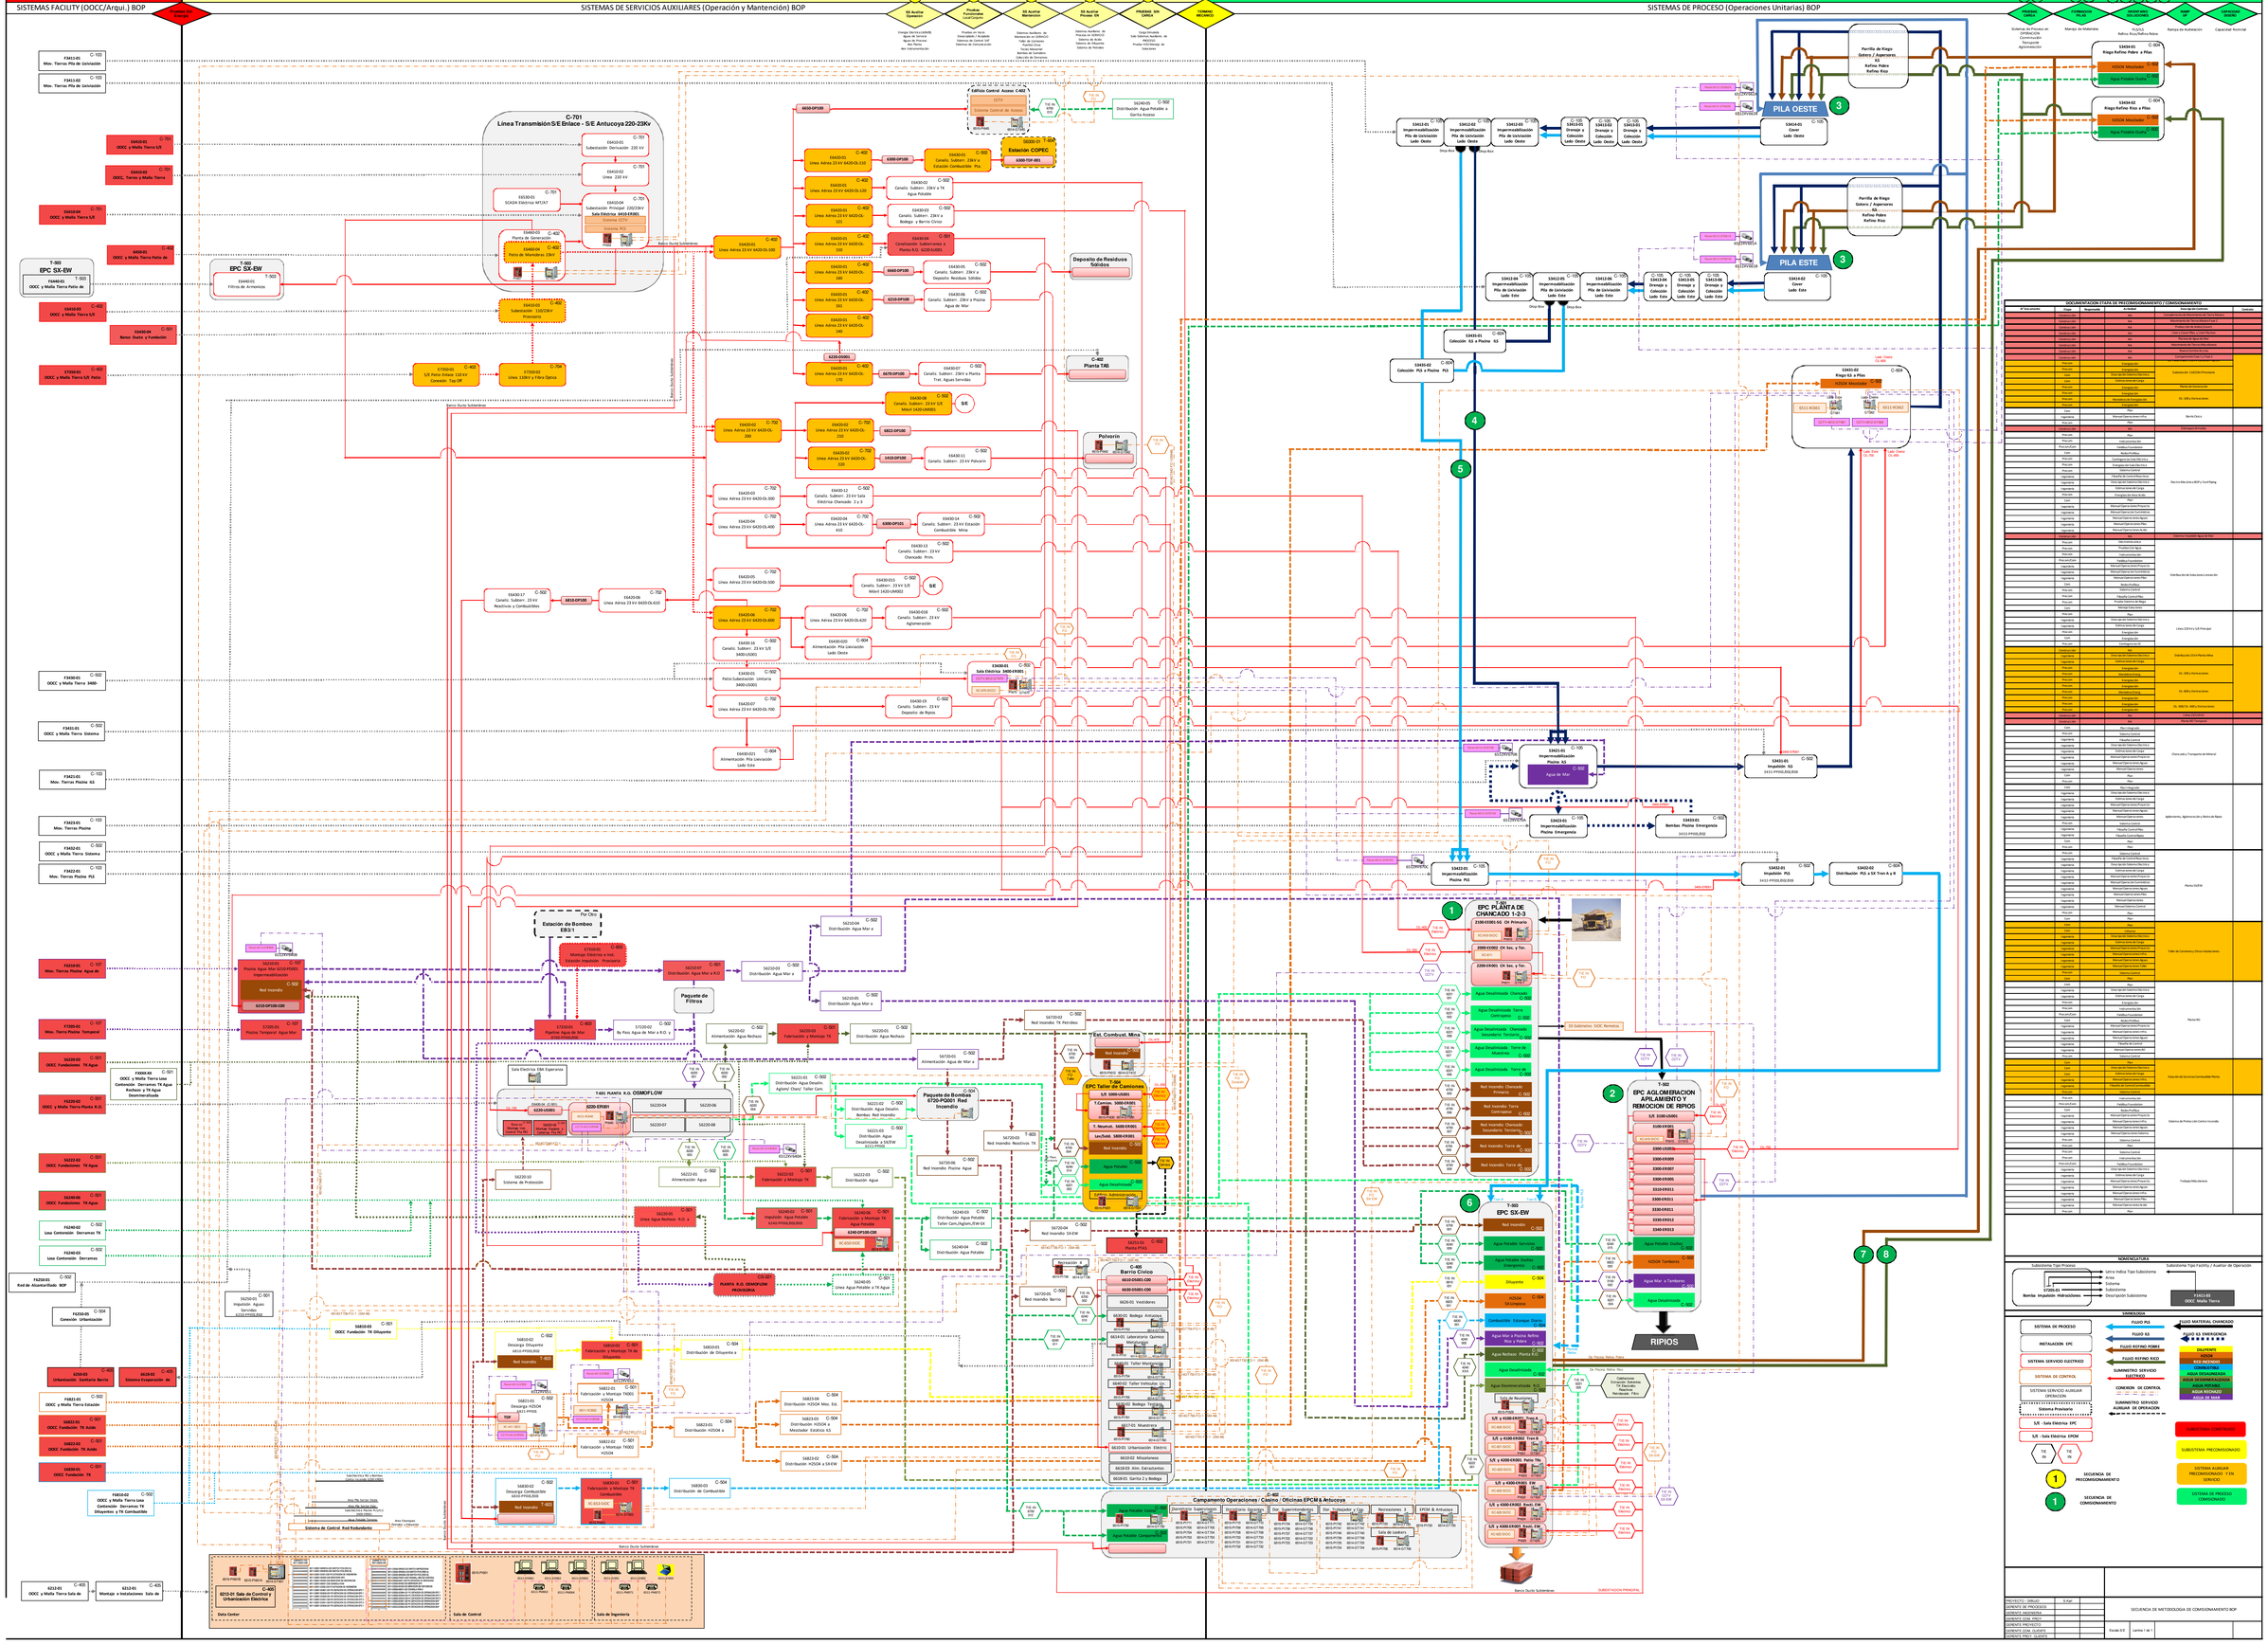

DOCUMENTACION ETAPA DE PRECOMISIONAMIENTO / COMISIONAMIENTO					
N° Documento	Tipo	Responsable	Ex Ante/BOP	Descripción Documento	Comentario
	Procedimiento			Procedimiento de Pruebas de Sistemas	
	Procedimiento			Procedimiento de Pruebas Mecanicas	
	Procedimiento			Procedimiento de Pruebas Electricas	
	Procedimiento			Procedimiento de Pruebas Instrumentos	
	Procedimiento			Lista y Orden Pilas y Lotes Pacheco	
	Procedimiento			Plan Control de Agua de Mar	
	Procedimiento			Mantenimiento de Pruebas Mecanicas	
	Procedimiento			Mantenimiento de Pruebas Electricas	
	Procedimiento			Calibraciones Pruebas Electricas	
	Procedimiento			Calibraciones Pruebas Mecanicas	
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	
	Plan		Electroquimsa	Plan Pruebas	
	Plan		Electroquimsa	Plan Pruebas	Subestación 110/220 Pocheano
	Plan		Electroquimsa	Plan Pruebas	
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	
	Plan		Electroquimsa	Plan Pruebas	
	Plan		Electroquimsa	Plan Pruebas	Ch - 08Pa Electricas Mec
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	Barrio Civico
	Plan		Energoplus	Plan Pruebas	
	Procedimiento		Pilar	Procedimiento	
	Procedimiento		Pilar	Procedimiento	Transporte Reactivos
	Procedimiento		Pilar	Procedimiento	
	Procedimiento		Pilar	Instrucciones	
	Procedimiento		Pilar	Instrucciones	
	Procedimiento		Pilar	Instrucciones	
	Procedimiento		Pilar	Instrucciones	
	Plan		Pilar	Notas Profilaxis	
	Plan		Pilar	Contingencia en Caso Falla Electrica	
	Plan		Pilar	Enlaces en Caso falla electrica	
	Plan		Pilar	Enlaces en Caso falla electrica	
	Plan		Pilar	Estudio Fallas Electricas Energia	
	Plan		Pilar	Ordenes de Trabajo Electricas	
	Plan		Pilar	Ordenes de Trabajo Electricas	Electro Mecánica MDP y Tool Plang
	Plan		Pilar	Estrategia de Carga	
	Plan		Pilar	Estrategia de Arranque	
	Plan		Pilar	Pilar	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Electricas	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Electricas	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Proyectos	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Electricas	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Electricas	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Agua	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Plan	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Agua	
	Procedimiento		Pilar	Operaciones Unitarias Agua de Mar	
	Procedimiento		Pilar	Operaciones Unitarias Agua de Mar	
	Procedimiento		Pilar	Procedimiento Operaciones	
	Procedimiento		Pilar	Procedimiento Operaciones	
	Procedimiento		Pilar	Procedimiento Operaciones	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Proyectos	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Proyectos	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Proyectos	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Proyectos	Distribución de Soluciones Lixiviación
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Plan	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones Plan	
	Plan		Pilar	Notas Profilaxis	
	Procedimiento		Pilar	Operaciones	
	Procedimiento		Pilar	Operaciones	
	Procedimiento		Pilar	Etiqueta Combustibles	
	Procedimiento		Pilar	Etiqueta Combustibles	
	Plan		Pilar	Manual Operaciones	
	Procedimiento		Pilar	Pilar	
	Plan		Pilar	Enlaces en Caso falla electrica	
	Plan		Pilar	Estrategia de Carga	Línea 220/Kv y S/E Principal
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	Distribución 23 Kv Planta Mina
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Electroquimsa	Plan	Ch - 08Pa Electricas Mec
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Electroquimsa	Plan	Ch - 08Pa Electricas Mec
	Plan		Energoplus	Plan	
	Plan		Energoplus	Plan	Ch - 08Pa - 48Pa Electricas
	Plan		Energoplus	Plan	
	Procedimiento		Pilar	Operaciones	
	Procedimiento		Pilar	Operaciones	
	Plan		Pilar	Plan	
	Plan		Pilar	Plan	
	Plan		Pilar	Plan
